


Fenyő és Hímzés

Színpaletta és javasolt megvalósítási sorrend a modernizált hargitatanc.ro weboldalhoz.

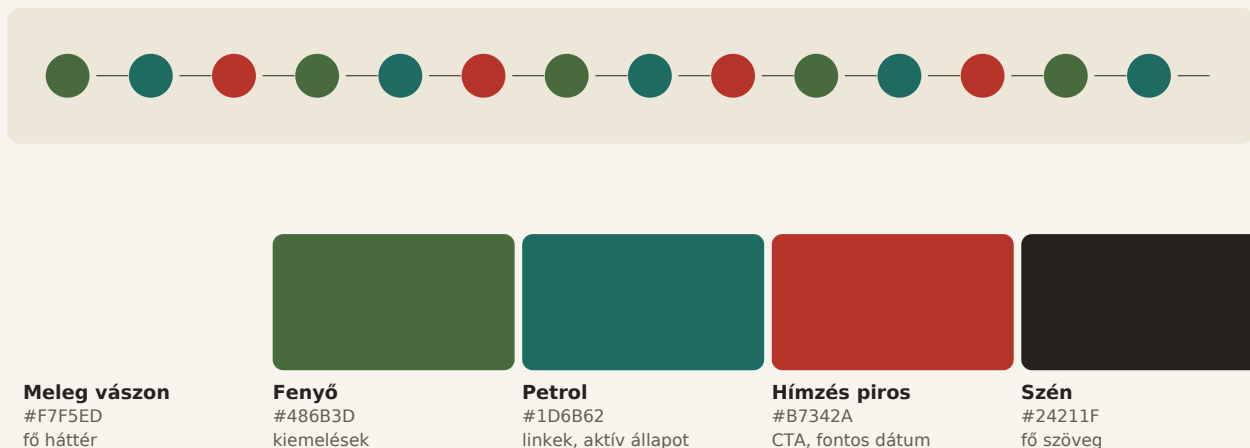

Ezt a palettát úgy érdemes használni, hogy a Meleg vászon adja a levegős alapot, a Szén maradjon a fő szövegszín, a Fenyő és Petrol legyen a navigáció és másodlagos felületek karaktere, a Hímzés piros pedig ritka, erős jelzésként jelenjen meg: foglalás, aktuális előadás, kiemelt hír.

Részletes megvalósítási sorrend

Az alábbi sorrend célja, hogy először a döntéseket és tartalmat tisztázd, csak utána építsd meg a rendszert. Így kevesebb lesz az újratervezés, és az admin felület sem válik túl bonyolulttá.

1. Célok és scope rögzítése

- Írd le egy oldalon, hogy az új honlap elsődleges feladata a helyfoglalás, az előadások bemutatása, a társulat hiteles reprezentációja és a hírek kezelése.
- Döntsd el, hogy induláskor lesz-e belső helyfoglalás, vagy csak külső jegylink és foglalási igény űrlap.
- Határozd meg az induló nyelveket. Ha most csak magyar indul, az adatmodellt akkor is érdemes többnyelvűsége előkészíteni.

2. Tartalmi leltár készítése

- Gyűjtsd össze a jelenlegi oldalról a megőrzendő híreket, eseményeket, társulati szövegeket, tagokat, fotókat és kapcsolati adatokat.
- Jelöld meg, mi kerül át változtatás nélkül, mit kell átírni, és mi elavult.
- A képeket rendezd mappákba: hero képek, társulati portrék, eseményképek, galéria albumok, támogatói logók.

3. Információs architektúra véglegesítése

- Legyen rövid, tiszta főmenü: Főoldal, Társulat, Hírek, Események, Galéria, Kapcsolat.
- A Műsoraink és Rendezvényeink jellegű régi struktúrát érdemes az Események alá összevonni, külön szűrőkkel.
- Tervezd meg az archív működését: ami elmúlt, automatikusan archív státuszt kap, de továbbra is kereshető marad.

4. Adatmodell megtervezése

- Készíts Prisma sémát legalább ezekkel: Event, Reservation, NewsPost, GalleryAlbum, GalleryImage, Member, PageContent, User.
- Az Event mezőkben legyen dátum, helyszín, típus, borítókép, foglalható státusz, kapacitás, külső jegylink és archív státusz.
- A PageContent kezelje a ritkán változó szövegeket: bemutatkozás, társulattörténet, kapcsolat, footer információk.

5. Design rendszer kialakítása

- Rögzítsd a Fenyő és Hímzés palettát CSS változóiban: --color-canvas, --color-forest, --color-petrol, --color-embroidery, --color-ink.
- Válassz egy karakteres címbetűt és egy nagyon jól olvasható szövegbetűt. Mibilon az olvashatóság legyen fontosabb, mint a díszítés.
- Készíts alap komponenseket: Button, Card, EventCard, NewsCard, SectionHeader, Badge, GalleryGrid, AdminTable.

6. Next.js projekt felépítése

- Indíts TypeScript alapú Next.js App Router projektet, ESLinttel, formázással és környezeti változókkal.
- Állítsd be a Prisma és PostgreSQL kapcsolatot, majd készíts első migrációt.
- Hozd létre az alap route struktúrát: /, /tarsulat, /hirek, /esemenyek, /galeria, /kapcsolat, /admin.

7. Publikus layout és navigáció

- Építsd meg először a közös layoutot: header, mobil menü, footer, social linkek, nyelvváltó helye.
- Mibilon a navigáció legyen nagy érintési célokkal, és ne legyen túl sok lenyíló menü.
- A footerben legyen kapcsolat, fenntartó, támogatók és social elérés, de ne váljon zsúfolttá.

8. Főoldal megvalósítása

- A legfelső blokkban legyen fotóváltó aktuális előadasképekkel, rövid üzenettel és Helyfoglalás CTA-val.
- A naptár induláskor lehet egyszerű eseménylista dátumcsoportosítással. Ez mibilon használhatóbb, mint egy zsúfolt havi naptár.

- Alatta jelenjen meg 3-6 következő esemény, majd néhány régebbi hír és esemény, hogy az oldal élőnek tűnjön.

9. Események és foglalás

- Készíts eseménylista és esemény részletoldalt. A részletoldalon legyen dátum, helyszín, műsorleírás, kép és foglalási blokk.
- Ha belső foglalás lesz, a Reservation rekord kapjon státuszt: új, visszaigazolt, elutasított, lemondott.
- Küldj visszaigazoló e-mailt a látogatónak és értesítést az adminnak. Induláskor elég egyszerű, megbízható folyamat.

10. Hírek, galéria és társulat oldalak

- A hírek legyenek dátum szerint rendezve, kategória vagy címke szűréssel.
- A galériát albumok szerint építsd, ne egyetlen végtelen képfolyamként. Így később könnyebb szerkeszteni.
- A társulati tagoknál legyen fotó, név, szerep és opcionális rövid bemutatkozás. A sorrendet adminból lehessen állítani.

11. Admin felület

- Először csak a legfontosabb CRUD felületeket készítsd el: események, hírek, tagok, galéria albumok, oldal szövegek.
- Legyen vázlat és publikált állapot, hogy szerkesztés közben ne kerüljön ki félkész tartalom.
- A képfeltöltésnél kötelező legyen az alt szöveg mező, mert SEO és akadálymentesség miatt is hasznos.

12. Tartalomfeltöltés és migráció

- Először a közelgő eseményeket és a főoldali képeket töltsd fel, mert ezek adják az oldal első benyomását.
- Ezután jöhetnek a társulati tagok, bemutatkozó szövegek, majd a fontosabb régi hírek és archív események.
- A régi tartalmaknál ne mindent migrálj vakon. Csak azt, ami értéket ad vagy keresőből még hasznos lehet.

13. Minőségellenőrzés

- Teszteld külön mobilon: főoldali hero, menü, eseményfoglalás, galéria, hosszú hírcímek, térkép és kapcsolat blokk.
- Nézd meg a teljesítményt: képméretek, lazy loading, Core Web Vitals, szerver oldali renderelés.
- Ellenőrizd az alap SEO-t: meta címek, leírások, Open Graph képek, canonical URL-ek, sitemap.

14. Élesítés és betanítás

- Állítsd be az éles adatbázist, storage-ot, domain rekordokat, e-mail küldést és biztonsági környezeti változókat.
- Készíts rövid szerkesztői útmutatót: új esemény, új hír, galéria feltöltés, foglalások kezelése.
- Az indulás után az első két hétben gyűjts hibákat és szerkesztői visszajelzéseket, majd egy stabilizáló körben javítsd őket.

Javasolt induló minimum

Kell induláskor	Főoldal, események, foglalási igény, hírek, társulat, galéria, kapcsolat, admin belépés és alap szerkesztés.
Későbbre hagyható	Komplex ülésrend, több jogosultsági szint, automatikus hírlevél, teljes többnyelvű admin, fejlett kereső.
Legfontosabb döntés	A helyfoglalás pontos működését érdemes elsőként lezárni, mert ez hat az adatmodellre, adminra és e-mail folyamatokra is.
